ТИФЛО ЦЕНТР Вертикаль

Ситуационный план

для предварительного расчета ПАНДУСА-КОНСТРУКТОРА

Адрес объекта:

Контактные данные:

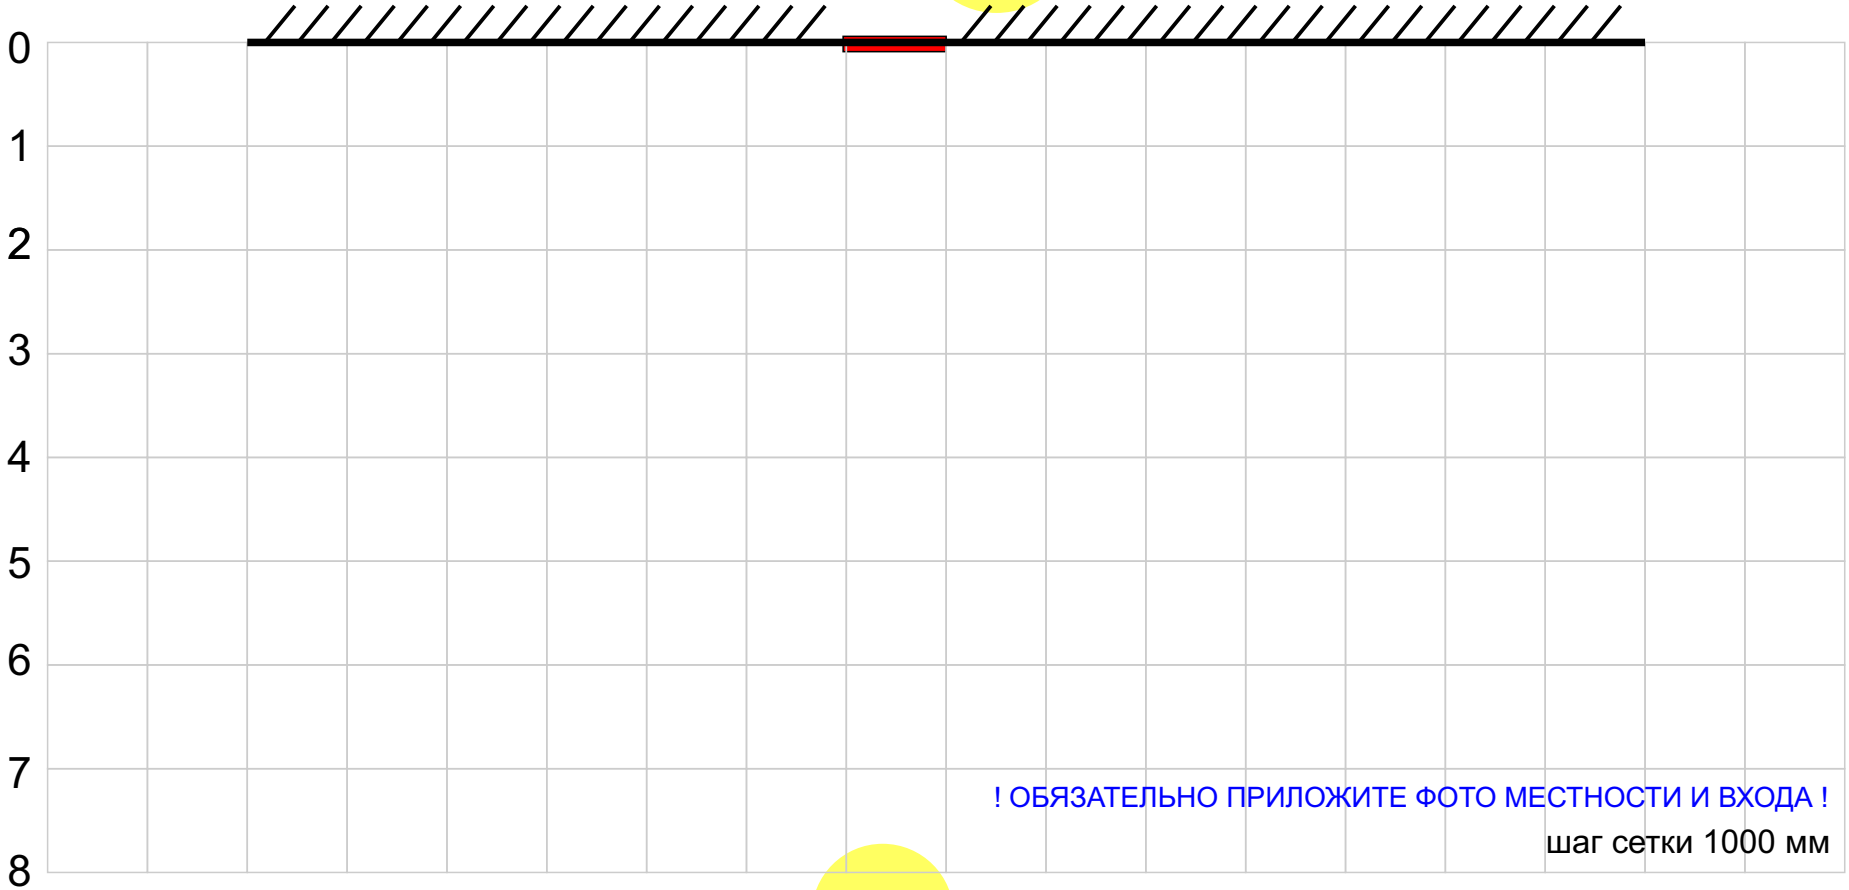

наклонная площадка



1800x940

горизонтальный разворот



2140x1540

горизонтальный поворот



1520x1520

1 Укажите «высоту подъема» пандуса мм

2 Рассчитаете кол-во «наклонных площадок»: «высота подъема»/150 = (округлить число вверх)

3 Нарисуйте на плане примерное расположение наклонных и горизонтальных площадок.

Внимание ! Для получения нормативного уклона - обязательно нужно разместить все наклонные площадки на плане ! Наклонные площадки можно соединить между собой горизонтальными в любой конфигурации. Количество наклонных площадок уменьшить невозможно, это приведет к нарушению норм уклона пандуса.

Желтый круг- поле обязательное к заполнению.

Заказчик:

габаритные размеры секций: наклонная 1120x1800, поворот 1700x1700, разворот 1650x2320

ТИФЛО ЦЕНТР Вертикаль

Ситуационный план
для предварительного расчета ПАНДУСА-КОНСТРУКТОРА

Адрес объекта: *г.Тверь. ул.Фрунзе 5*

Контактные данные: *указать телефон !!!*

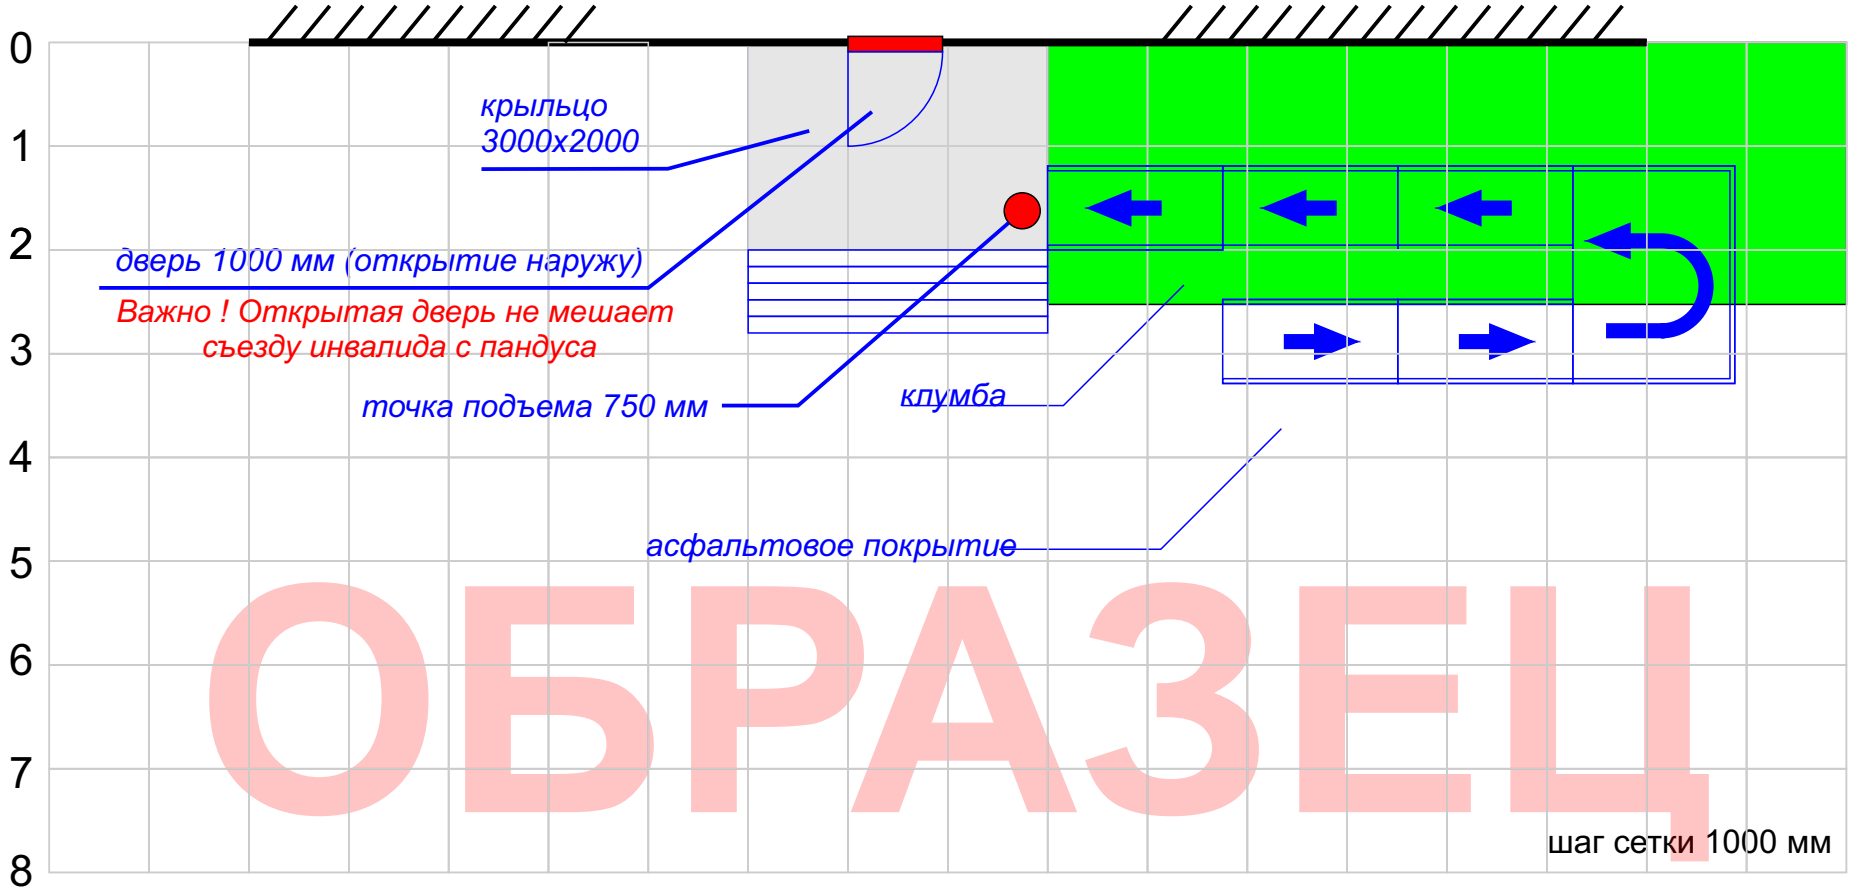

наклонная площадка



1800x940



2140x1540

горизонтальный поворот



1520x1520

1 Укажите «высоту подъема» пандуса *750* мм

2 Рассчитаете кол-во «наклонных площадок»: «высота подъема»/150 = *5* (округлить число вверх)

3 Нарисуйте на плане примерное расположение наклонных и горизонтальных площадок.

Внимание ! Для получения нормативного уклона - обязательно нужно разместить все наклонные площадки на плане ! Наклонные площадки можно соединить между собой горизонтальными в любой конфигурации. Количество наклонных площадок уменьшить невозможно, это приведет к нарушению норм уклона пандуса.

Заказчик: *ОАО «Газпром»*

! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЕ ФОТО МЕСТНОСТИ И ВХОДА !

ТИФЛО ЦЕНТР Вертикаль

Ситуационный план
для предварительного расчета ПАНДУСА-КОНСТРУКТОРА

Адрес объекта: _____ Контактные данные: _____

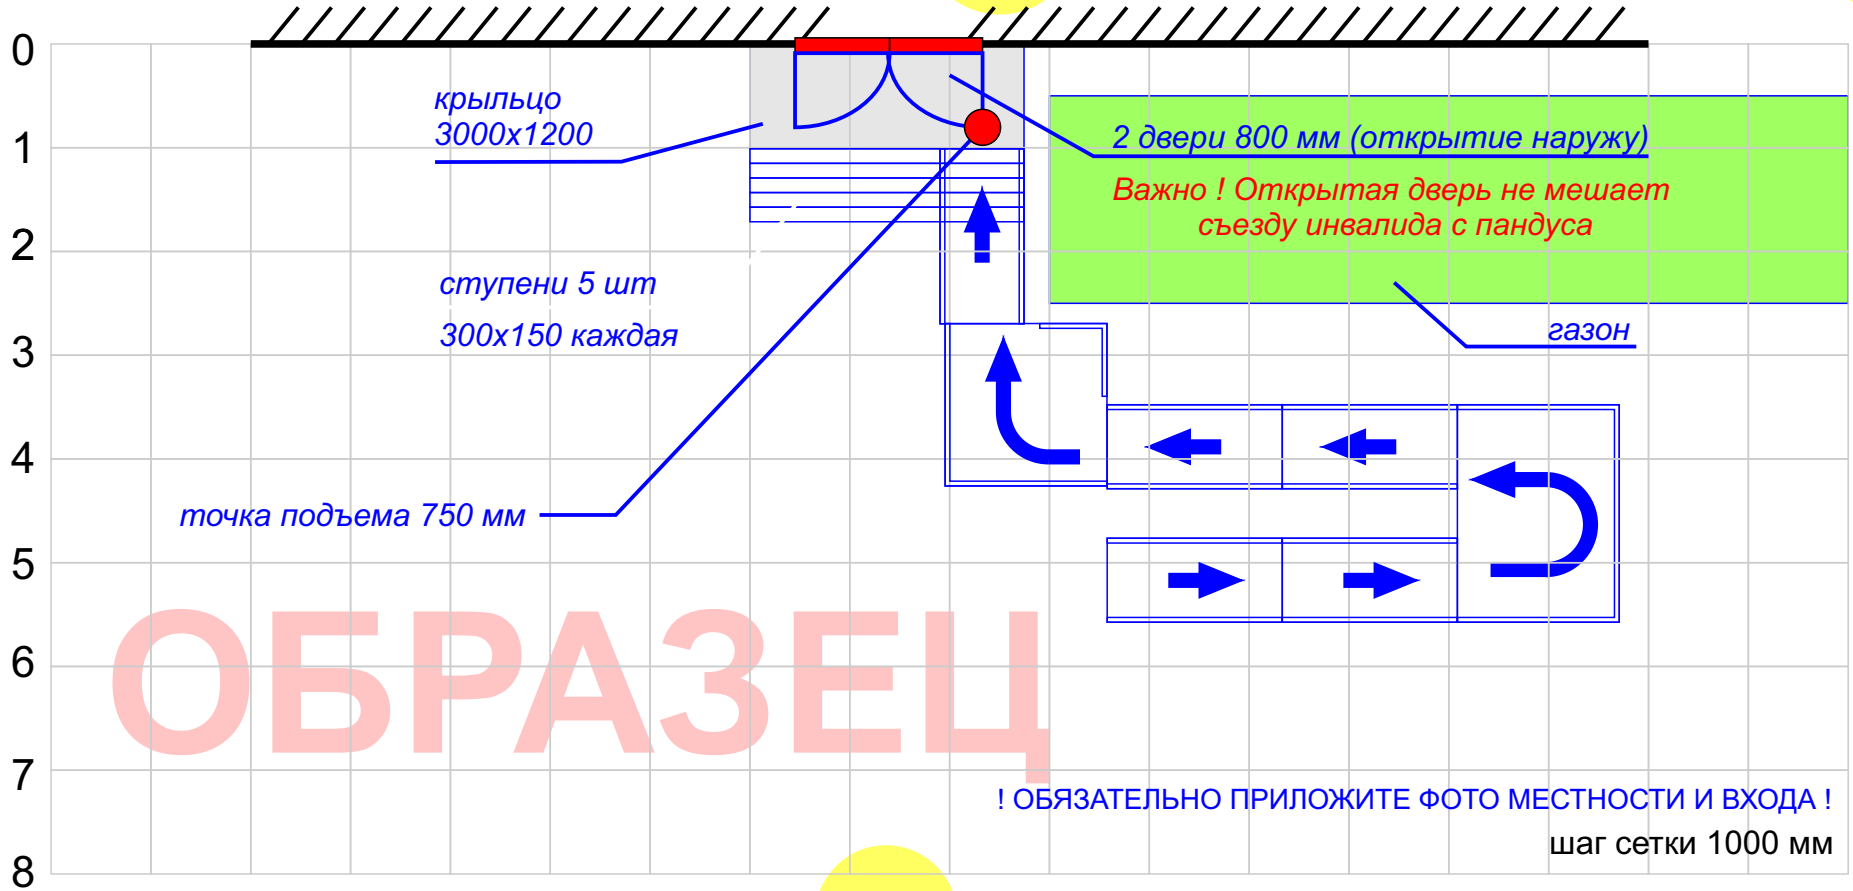

наклонная площадка



1800х940

горизонтальный разворот



2140х1540

горизонтальный поворот



1520х1520

1 Укажите «высоту подъема» пандуса _____ мм

2 Рассчитаете кол-во «наклонных площадок»: «высота подъема»/150 = _____ (округлить число вверх)

3 Нарисуйте на плане примерное расположение наклонных и горизонтальных площадок.

Внимание ! Для получения нормативного уклона - обязательно нужно разместить все наклонные площадки на плане ! Наклонные площадки можно соединить между собой горизонтальными в любой конфигурации. Количество наклонных площадок уменьшить невозможно, это приведет к нарушению норм уклона пандуса.

Желтый круг- поле обязательное к заполнению.

Заказчик: _____
